

Rappel du projet : SSEC

Scrum Master : Mohamed Ayoub Karroud

- Bonne compréhension du cadre Scrum, disponibilité régulière pour assurer le suivi et lever les obstacles rencontrés

Product Owner : Saad Allioui

- Forte disponibilité, gestion efficace des priorités ainsi que le backlog et interactions régulières avec l'équipe de développement

Développeur 1 : Faris Moughamir

Développeur 2 : Mohamed Ayman Roukhsi

- Fortes compétences techniques, disponibilité élevée permettant une contribution active pendant les sprints, ainsi qu'une capacité à collaborer efficacement

L'objectif de ce projet est de faciliter la gestion d'une entreprise commerciale en rassemblant tous les outils nécessaires à cela en une seule et unique application web, d'après le livrable précédent, nous avons défini une durée totale prévue de 3 mois, avec 2 sprints envisagés, d'une vélocité autour des 23~24 points.

Product Backlog :

ID	User Story	Critères d'acceptations	Story Points	Priorité	Sprint
US-01	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace de travail personnel	Formulaire valide avec redirection automatique; message d'erreurs en cas de données non valides	3	Must	Sprint 1
US-02	En tant qu'administrateur, je veux gérer les rôles des utilisateurs afin de vérifier les permissions	Modification des rôles avec changements sauvegardés; message d'interdiction si l'utilisateur accède à des données en dehors de son rôle	5	Must	Sprint 1
US-03	En tant que membre de la direction, je veux un tableau de bord interactif afin de suivre les performances	Affichage des KPIs globaux à l'accès; données mises à jour en temps réel en rechargeant la page	8	Must	Sprint 1

	des employés et avoir une vue globale du travail effectué				
US-04	En tant qu'employé, je souhaite consulter un tableau de bord clair afin d'organiser mes tâches et affiner mon travail	Affichage des tâches assignées lors du chargement de la page; accès aux données personnelles d'employé	5	Must	Sprint 1
US-05	En tant qu'administrateur, je veux recevoir des e-mails de confirmation ou alertes sécurité afin de mieux gérer le système	Après validation d'une action importante, envoi d'email de confirmation; envoi d'alerte immédiatement après un événement potentiellement critique	3	Should	Sprint 1
US-06	En tant que membre de la direction, je veux des graphiques dynamiques sur mon tableau de bord afin de mieux visualiser l'évolution de l'entreprise	Graphiques des données disponibles générés à l'affichage du dashboard; si mise à jour, les données changent au rechargement de la page	8	Should	Sprint 2

US -07	En tant que membre de la direction, je veux appliquer des filtres afin de faciliter l'analyse des performances	Changement des données correctement après applicage d'un filtre; données cohérentes même en appliquant plusieurs filtres	3	Could	Sprint 2
US -08	En tant qu'utilisateur, je veux avoir accès à un historique de notifications afin de retrouver des alertes que j'aurai manquées	Listage de toutes les notifications dans l'historique; affichage du contenu de la notification après clic	1	Could	Sprint 2
US -09	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications d'aides afin d'améliorer ma manière de travailler	Notifications d'aides automatiques après des actions où une aide est recommandée; possibilité d'ignorer l'aide et la laisser disparaître	3	Could	Sprint 2
US -10	En tant que membre de la direction, je veux exporter les données graphiques en fichier PDF ou	Génération automatique de fichier quand on clique sur l'export; fichier téléchargé automatiquement	8	Could	Sprint 2

	Excel afin de partager les données librement	t si génération réussie; message d'erreur si données invalides ou indisponilbes			
--	--	---	--	--	--

Planification des Sprints :

Sprint	Période	Sprint Goal	US incluses	Total pts
Sprint 1	Sem 1 – Sem 2	Mettre en place le système d'authentification et créer les interfaces de base des dashboards respectifs des utilisateurs	US-01, US-02, US-03, US-04, US-05	24
Sprint 2	Sem 3 – Sem 4	Remplir les dashboards par des graphiques dynamiques avec applicage de filtres, notifications d'aides, et implémentation d'historique et export en fichier PDF ou Excel,	US-06, US-07, US-08, US-09, US-10	23

Sprint 1 – Backlog :

US	Sous-tâche	Responsable	Estimation	Statut
US-01	Formulaire de connexion	Faris	2h	A faire
US-01	Implémenter la vérification JWT	Ayman	4h	A faire
US-02	Concevoir la base de données pour les rôles	Ayman	2h	A faire
US-02	Créer l'interface de l'admin pour gestion des rôles	Faris	4h	A faire
US-03	Créer l'interface du dashboard de la direction	Faris	4h	A faire
US-03	Implémenter les KPI (données d'employés et d'entreprise)	Ayman	6h	A faire
US-04	Créer l'interface du dashboard des employés	Faris	3h	A faire
US-04	Système de gestion de tâches	Faris	4h	A faire
US-05	Créer les templates d'emails pour confirmations ou alertes	Ayman	1h	A faire
US-05	Intégrer le service d'envoi d'emails SendGrid	Ayman	2h	A faire

Sprint 2 – Backlog :

US	Sous-tâche	Responsable	Estimation	Statut
US-06	Intégrer la librairie Charts.js	Ayman	2h	A faire
US-06	Lier les graphiques aux données backend	Ayman	4h	A faire
US-07	Implémenter la logique de filtrage côté backend	Faris	4h	A faire
US-07	Ajouter les composants de filtrage dans l'interface	Faris	2h	A faire
US-08	Développer l'affichage de l'historique	Faris	2h	A faire
US-08	Créer la base de données pour stocker les notifications	Ayman	2h	A faire
US-09	Créer le template des notifications	Ayman	1h	A faire
US-09	Implémenter le système de notifications en temps réel	Ayman	6h	A faire
US-10	Implémenter l'export de	Faris	4h	A faire

	fichier côté backend			
US-10	Ajouter le bouton pour exporter dans l'interface utilisateur	Faris	1h	A faire

Simulation des cérémonies Scrum :

1 – Sprint Planning

Au niveau du sprint planning, la réunion a pris environ 3 heures avec la participation des 4 membres de l'équipe : le Scrum Master, le Product Owner et les 2 développeurs. L'équipe s'est mise d'accord pour sélectionner les stories de US-01 à US-05 pour le premier sprint, afin de rattraper le retard du projet le mieux était de prioriser la création de toutes les interfaces de bases et dashboards avec système d'email implémenté. On s'est mis d'accord que le Sprint Goal serait la création d'interfaces et dashboards avec emails fonctionnels, en identifiant de potentiels risques tels que la surcharge de travail qui entraînerait un retard ou abandon de stories.

2 – Exemple de Daily Scrum (Jour 1)

Membre	Qu'ai-je fait hier?	Que vais-je faire aujourd'hui ?	Ai-je des blocages ?

Ayoub / Scrum Master	Organiser la réunion de planification de Sprint	Suivre le commencement du Sprint est rester disponible pour gérer un potentiel obstacle	Pas pour le moment
Saad / Product Owner	Planifier le premier Sprint ainsi que les Stories à prioriser	Construire le Backlog et lancer le Sprint 1	Pour l'instant, non
Faris / Développeur	Participé au Sprint Planning et discuté des Stories qui m'ont été attribuée	Créer le formulaire de connexion et terminer l'interface de l'administrateur pour la gestion des rôles	Contrainte de temps mais les templates des pages ont été préparées en avance
Ayman / Développeur	Participé au Sprint Planning et discuté des tâches complémentaires avec celles de Faris	Créer la base de données des différents rôles de l'entreprise et implémenter la vérification JWT au formulaire de connexion	JWT a pris un peu plus de temps que prévu mais la base de données a été reprise d'un autre projet ce qui fera gagner du temps

3 – Sprint Review

A l'issu de ce premier Sprint, nous avons pu livrer les premières fonctionnalités principales du projet, telles que le dashboard des

employés, le dashboard de la direction, l'authentification avec vérification et le système d'e-mails. Aucune Story n'a été abandonnée ou non terminée, d'après le Product Owner, ce Sprint était chargé mais des préparations au préalable ont aidé à gagner du temps précieux. L'équipe a fait du bon travail, en terminant 24 points sur les 24 initialement prévus, le Sprint 1 est clôturé avec succès.

4 – Sprint Rétrospective

Start	L'équipe devrait utiliser plus souvent les commentaires en Stories, cela permet une transparence et communication meilleure, et permet au Scrum Master de mieux gérer les blocages
Stop	L'équipe devrait arrêter de planifier trop de Stories en un seul Sprint, ceci était à cause d'une contrainte de temps, mais l'équipe devrait mieux gérer cela et maintenir des Sprints avec vélocité équilibrée
Continue	L'équipe devrait à faire les choses en avance, avoir des templates ou des essais déjà prêts, que ce soit d'interfaces ou de base de données, permet un gain de temps considérable surtout si le travail devient chargé ou si le client demande des fonctionnalités en dernière minute

Definition of Ready et Definition of Done :

1 – Definition of Ready


#	Critère de la Definition of Ready	Dimension
1	La User Story est rédigée au format “En tant que..., je veux..., afin de...”	Compréhension
2	Les critères d’acceptations sont définis et testables	Qualité fonctionnelle
3	Points de Story attribués	Estimation
4	Réalisable en 1 Sprint (pas plus que 8 Story Points)	Taille
5	Pas de dépendance, peut être développée seule	Indépendance

2 – Definition of Done

#	Critère de la Definition of Done	Dimension
1	Le code est revu par au moins un autre développeur	Qualité code
2	Les tests unitaires associés passent à 100%	Tests
3	Les tests d’intégration sont validés	Tests
4	Les critères d’acceptation sont tous validés	Critères d’acceptation
5	La documentation est mise à jour	Documentation
6	La fonctionnalité est déployée sur l’environnement de recette	Déploiement

Suivi et indicateurs :

1 – Burndown Chart :

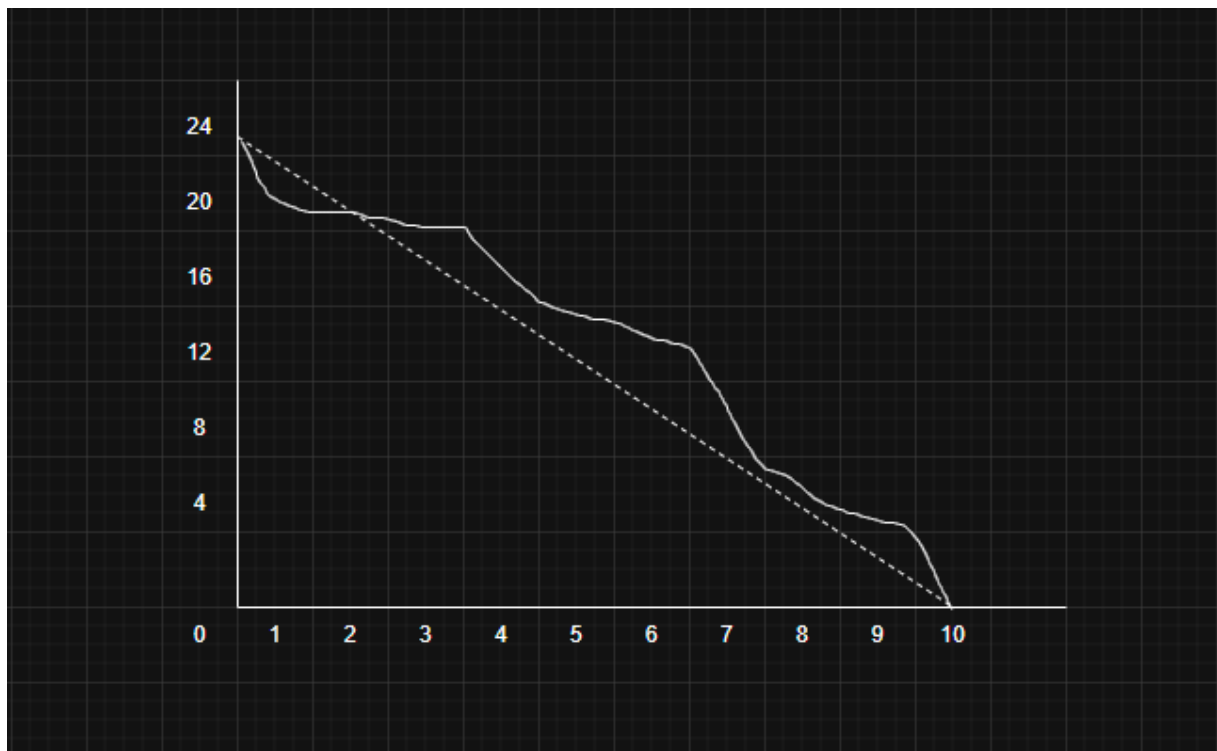

2 – Outils de gestion de projet : Voir le lien Jira en objet du mail

3 – Analyse des risques liés à Scrum

#	Risque identifié	Mesure de mitigation
1	Instabilité du Backlog : User Story incohérentes ou qui ne respectent pas la norme ou une mauvaise attribution des Story Points.	Clarifier les critères d'acceptations des Stories et prioriser la stabilité complète du Backlog avant de lancer un Sprint
2	Manque de disponibilité des membres clés	Définir les disponibilités dès le départ en gardant des moments clés obligatoires comme le Daily Scrum
